POC Basilicata

Programma Operativo Complementare 2014-2020
al POR FESR 2014-2020 della Regione Basilicata

REGIONE BASILICATA

Comune di Melfi (PZ)

Committente:

OMNIA PROPTER EVANGELIUM

Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa

Largo Duomo, 12 - 85025 Melfi (PZ)

Oggetto:

Lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del Palazzo del Seminario Diocesano quale polo di attrazione culturale, turistica e per l'ospitalità e l'accoglienza religiosa nel complesso monumentale del Palazzo Vescovile di Melfi Diocesi di Melfi - Rapolla - Venosa. CUP:F69C25000130002

R.U.P: Ing. Geremia Russo Spena

Ingegnere
RUSSO SPENA
GEREMIA
ORDINE DEGLI
INGEGNERI DELLA
PROVINCIA DI
POTENZA
13.03.2026 08:35:09
GMT+00:00

Progettisti:

Architettonico:
Arch. Michele Antonio Schirò - Arch. Stefania Schirò

Impianti Elettrici:
Ing. Giovanni Montanarella

Impianti Meccanici:
Ing. Giovanni Ettorre

Rilievi, computazione e analisi energetica:
Geom. Alfonso Fasanella

Cordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Michele Todisco

Dott. Ing. TODISCO MICHELE

Stato progetto: **Progetto esecutivo**

Nome Disegno

Diagramma di Gant

Nome tavola:

E_SI.08

Data: febbraio 2026

Scala Disegno: **1:......**

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA
1	ALLESTIMENTO CANTIERE
2	Montaggio baracche
3	Montaggio bagni chimici e box ufficio
4	Allestimento di depositi
5	Apposizione segnaletica cantiere
6	Montaggio ponteggio
7	Montaggio recinzione e cancello di cantiere
8	Realizzazione impianto elettrico e di terra del cantiere
9	Viabilita' e segnaletica cantiere
10	MANUTENZIONE ORDINARIA COPERTURE
11	Rimozione manto copertura
12	Realizzazione di massetti
13	Isolamento termico di coperture
14	Impermeabilizzazione con guaina bituminosa
15	Sostituzione pluviali discendenti
16	Ricomposizione e/o sostituzione tegole e coppi
17	DEMOLIZIONI, TAGLI E SMONTAGGI
18	Demolizione di pavimenti
19	Demolizione di massetti
20	Tagli di pavimento
21	Rimozione di porte interne
22	Smontaggio impianti
23	Trasporto a rifiuto
24	IMPIANTI INTERNI
25	Impianto di condizionamento
26	Impianto di riscaldamento autonomo
27	Impianto igienico sanitario
28	Esecuzione di tracce in muratura
29	Realizzazione impianto elettrico interno
30	Taglio e posa tubazioni per impianti tecnologici
31	Posa in opera sanitari e rubinetteria
32	Posa in opera di caldaie e corpi scaldanti
33	Posa in opera impianto di climatizzazione
34	Installazione allarmi, rilevatori fumo, luci di emergenza e
35	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
36	Esecuzione di massetti
37	Pavimenti
38	Rivestimenti
39	FINITURE ESTERNE
40	Tinteggiature esterne
41	FINITURE INTERNE
42	Posa infissi interni
43	Tinteggiature interne
44	RIMOZIONE CANTIERE EDILE
45	Smontaggio baracche
46	Smontaggio impianto elettrico di cantiere
47	Smontaggio ponteggio
48	Smontaggio recinzione cantiere

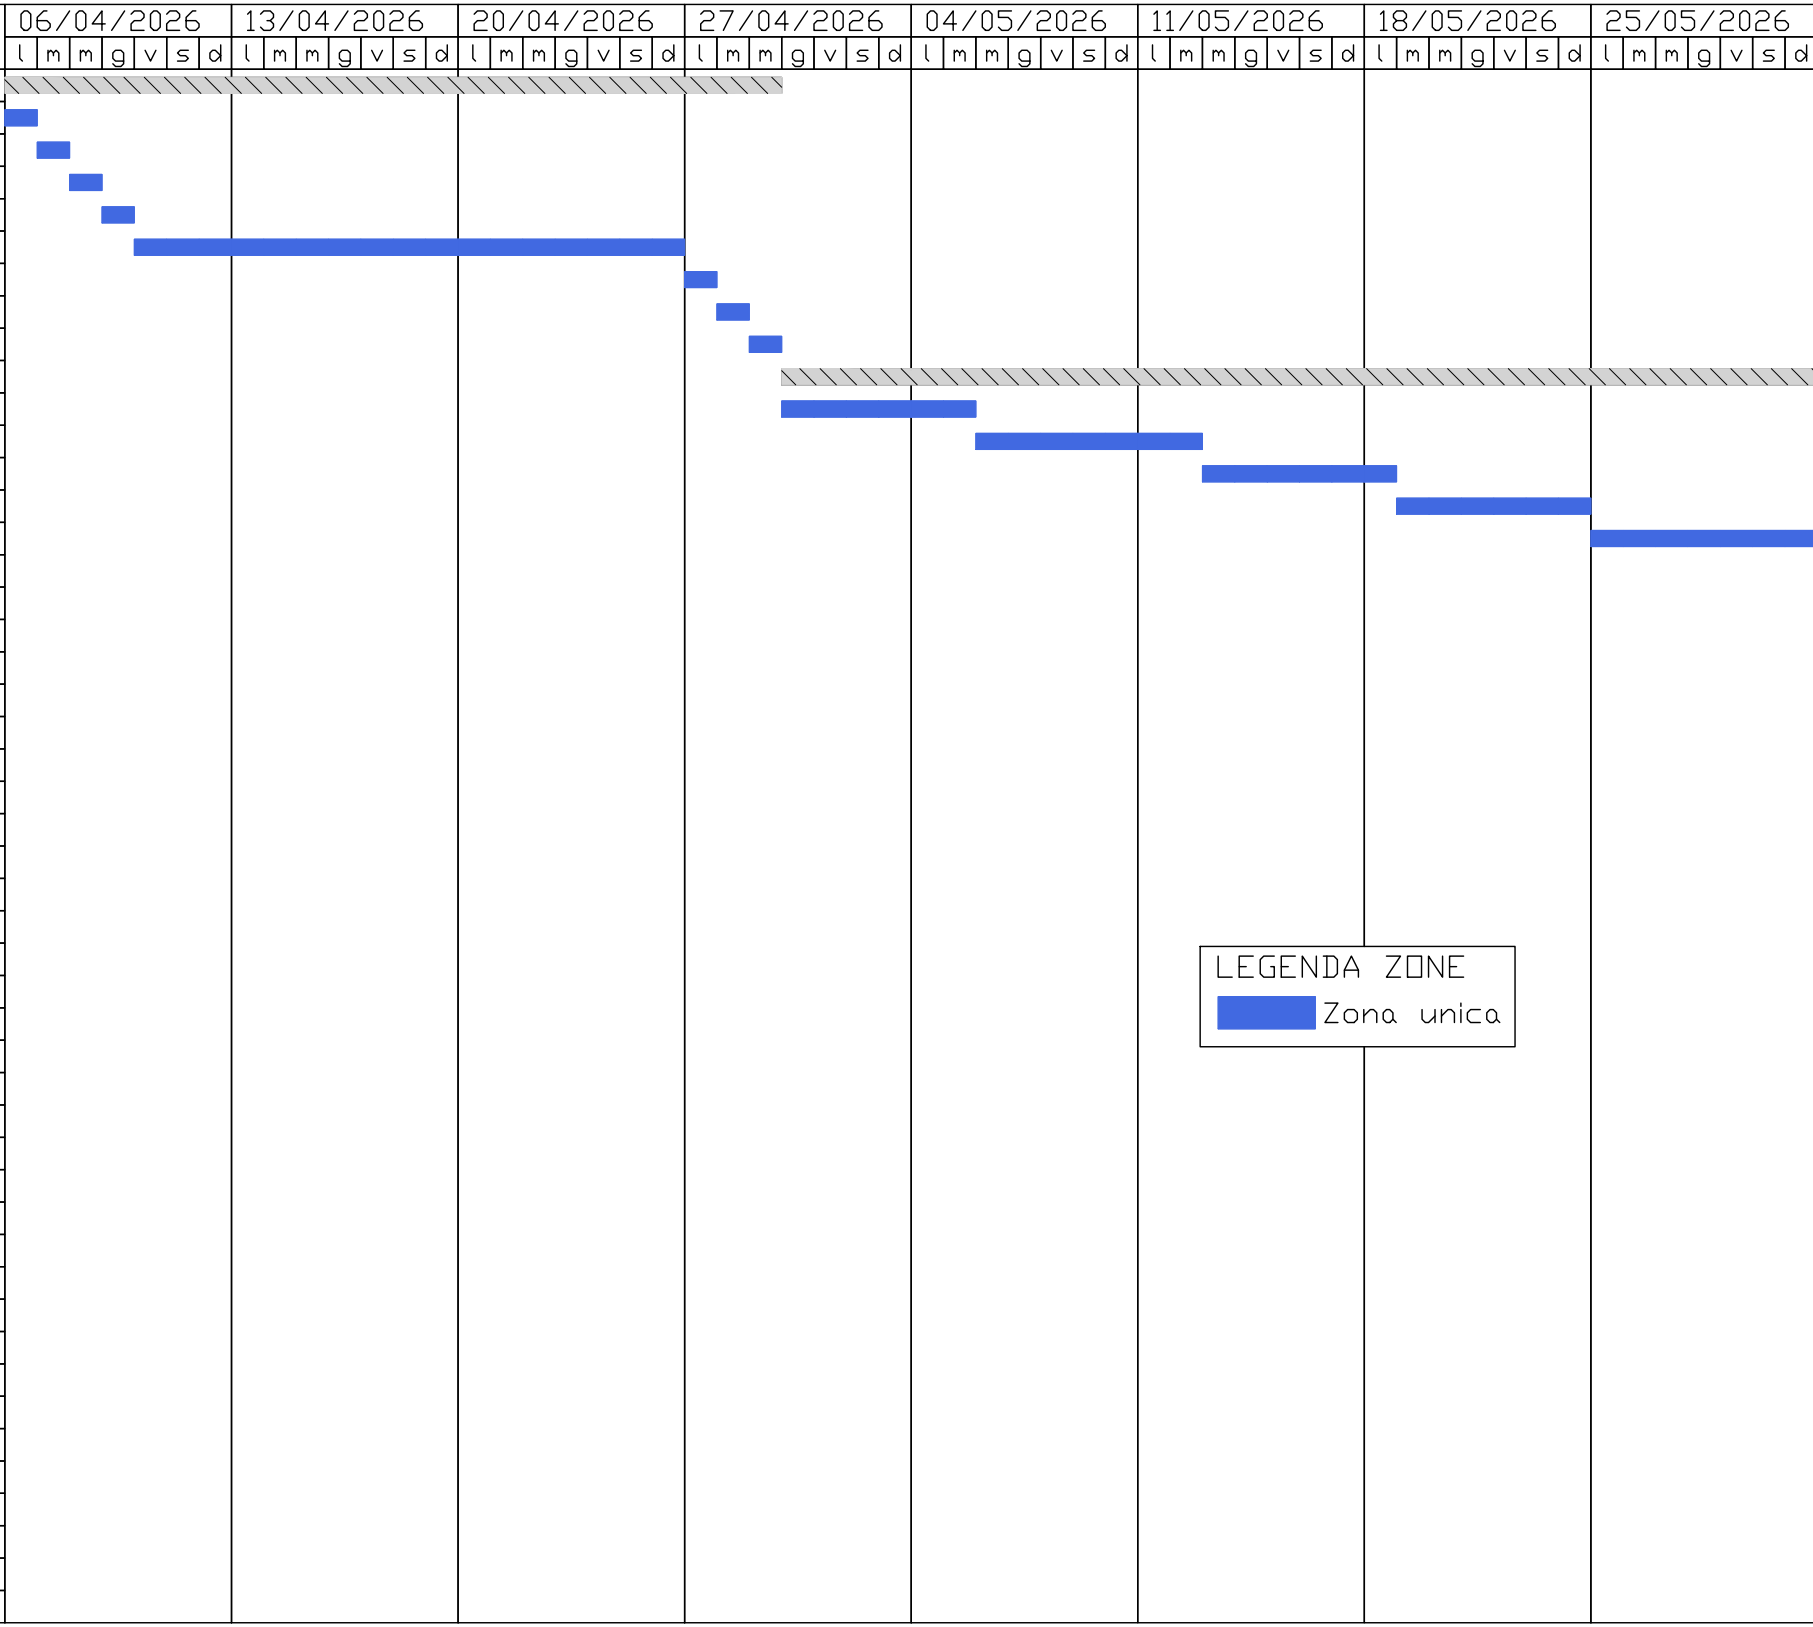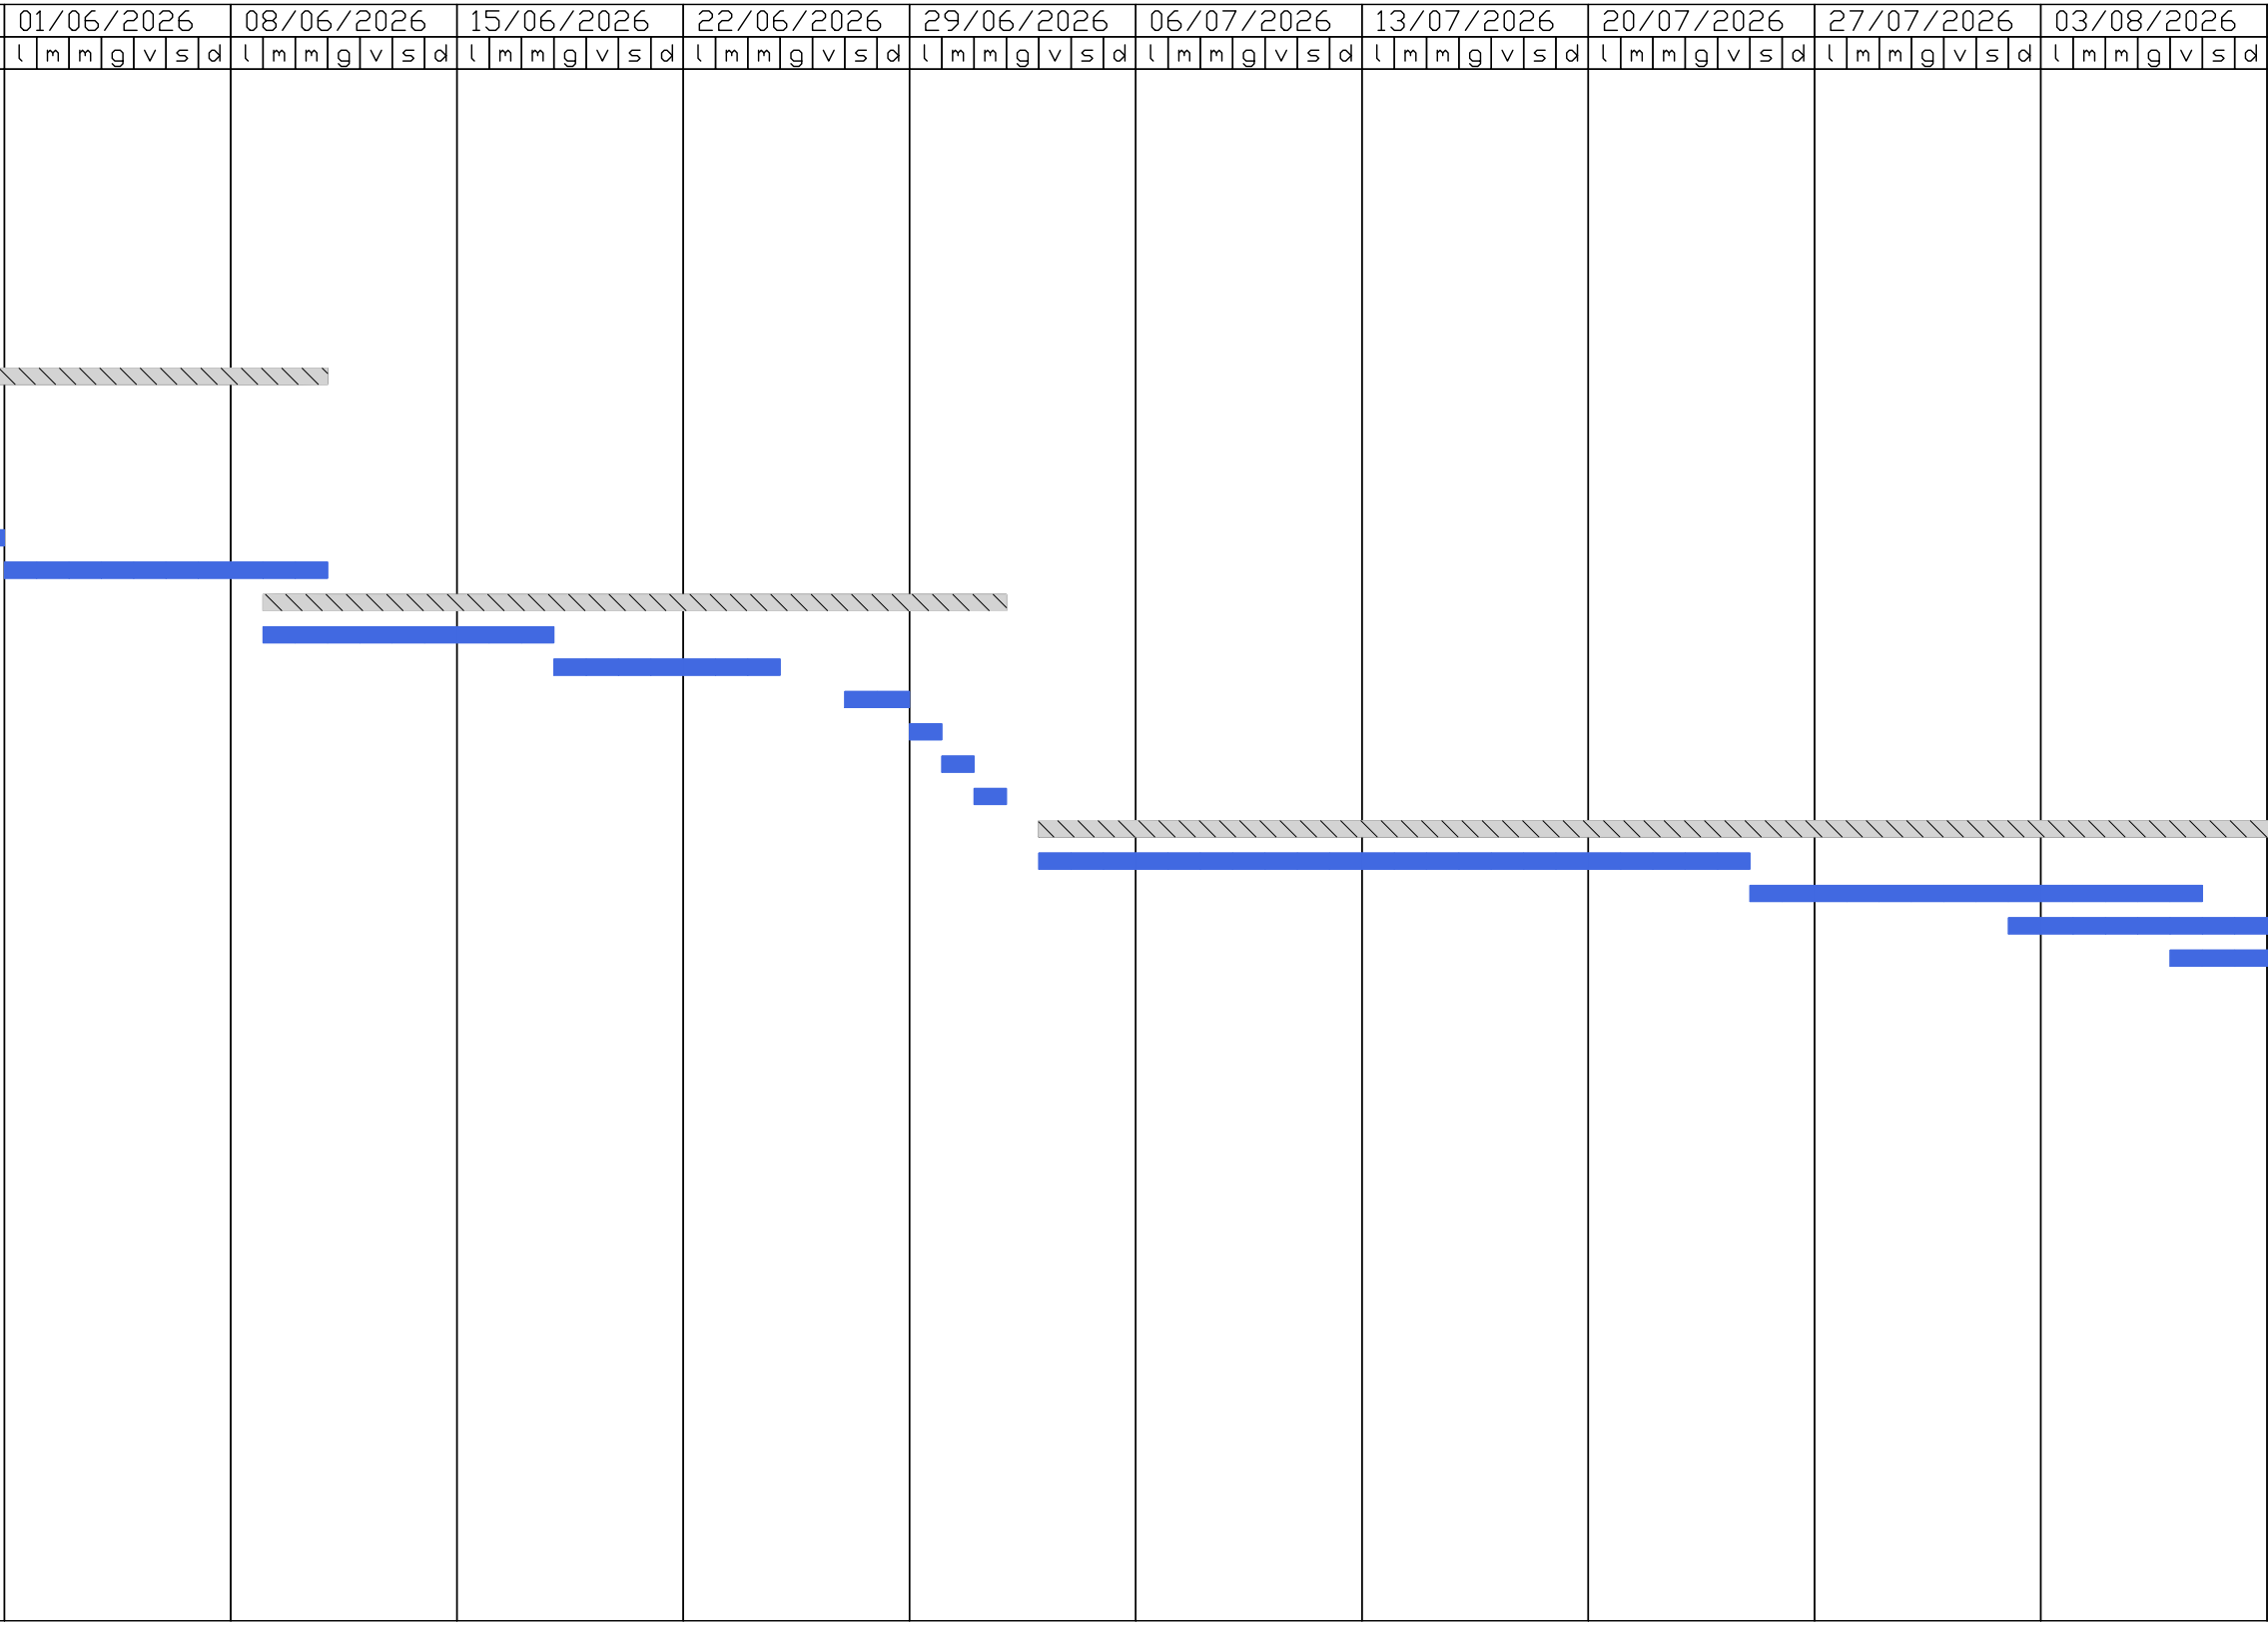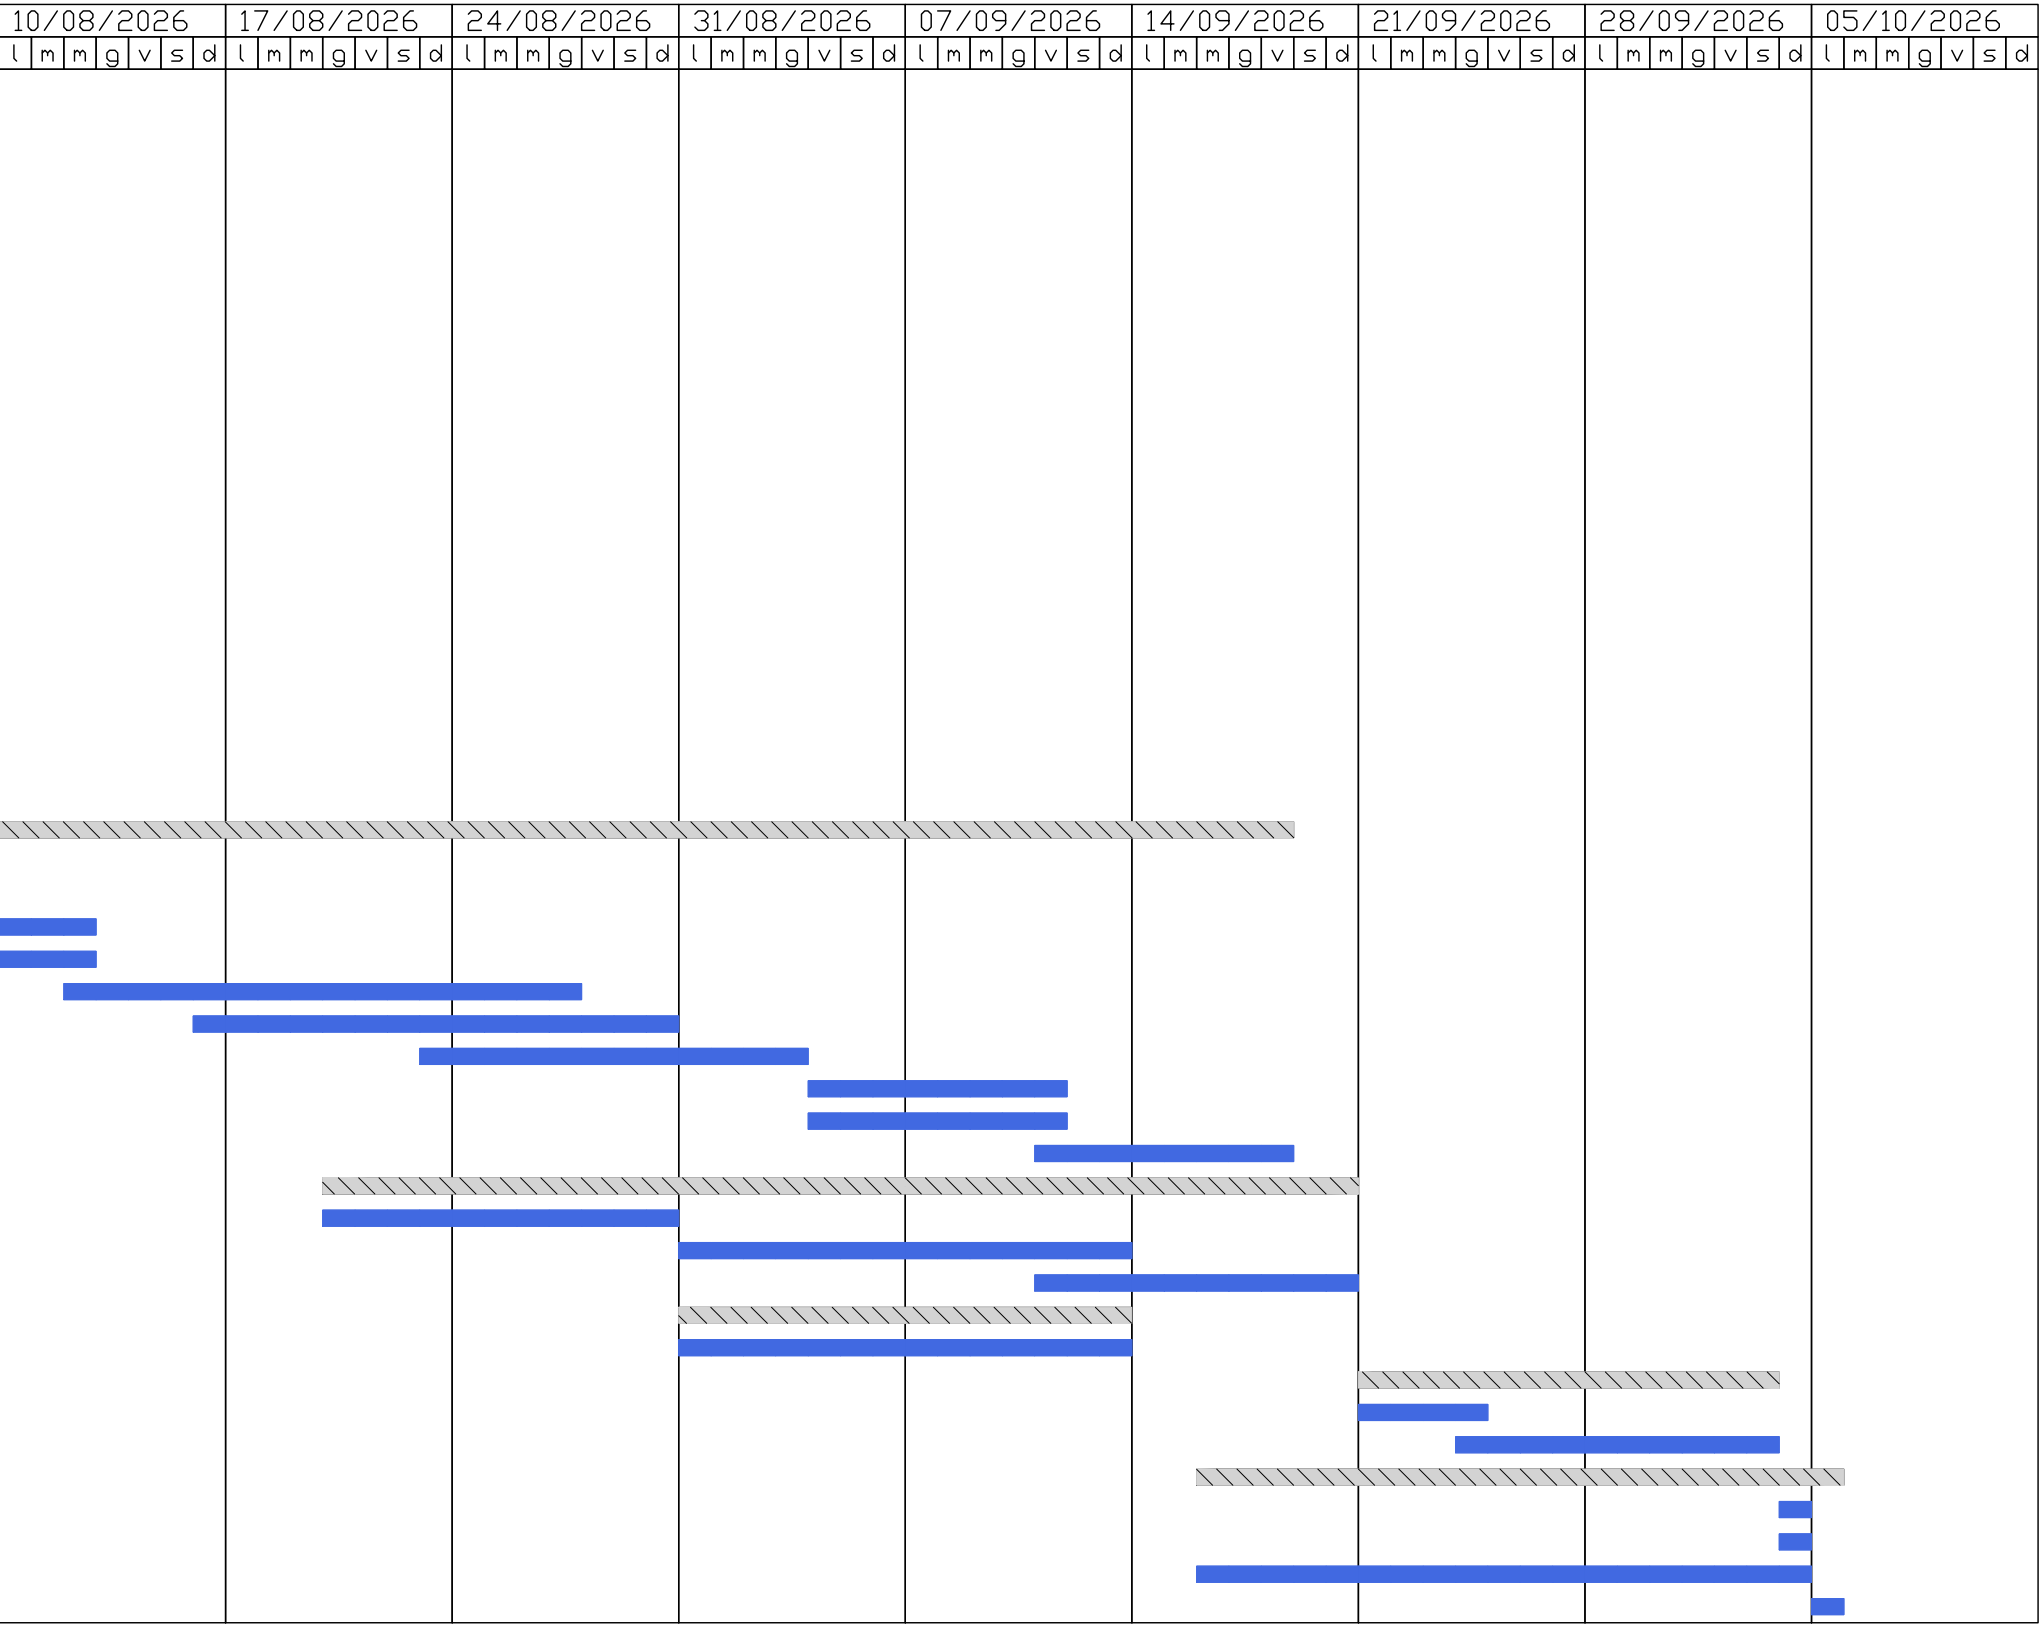	DURATA
	24
	1
	1
	1
	1
	17
	1
	1
	1
	42
	6
	7
	6
	6
	7
	10
	23
	9
	7
	2
	1
	1
	1
	78
	22
	14
	11
	6
	16
	15
	12
	8
	8
sprinkler	8
	32
	11
	14
	10
	14
	14
	13
	4
	10
	20
	1
	1
	19
	1
